

2025. 1.

새롭게 도약하는 행복장수



## 건설교통과 소관 이장회의 홍보자료



장 수 군  
[ 건설교통과 ]



## 1

## 국도13호 임실-장수 도로시설개량공사

## 사업개요

- 위 치 : 임실군 오수면 오수리 ~ 장수군 장수읍 개정리
- 사업기간 : 2021년 ~ 2027년
- 사업비 : 1,516억원
- 사업내용 : L=24.2km , B=11.5m  
(교량 16개소, 터널 6개소, 교차로 20개소)
- 시행기관 : 익산지방국토관리청
- 공 정 률 : 20%

## □ 개 요

위 치	1공구	2공구	비고
공 사 명	임실~장수 도로시설개량공사(1공구)	임실~장수 도로시설개량공사(2공구)	
위 치	오수면 오수리 ~ 산서면 마하리	산서면 마하리 ~ 장수읍 개정리	
사 업 량	연장 14.3km, 폭 11.5m (교량 11개소, 터널3개소, 교차로 13개소)	연장 9.9km, 폭 11.5m (교량5개소, 터널3개소, 교차로7개소)	
사 업 비	84,254백만원 (시설비 72,868백만원, 보상비 4,421백만원, 부대경비 6,965백만원)	67,482백만원 (시설비 57,167백만원, 보상비 4,363백만원, 부대경비 5,952백만원)	
공사기간	2021년 12월 20일 ~ 2027년 11월 18일	2021년 12월 15일 ~ 2027년 11월 13일	
건설사업 관 리	(주)신명건설기술공사, (주)KG엔지니어링 (주)동해종합기술공사	(주)동일기술공사, (주)태일건축사사무소, (주)효광엔지니어링	
시 공 사	동성건설(주)(70.0%), (주)리드(10.0%), 대원종합건설(주)(10.0%), 수성건설(주)(10.0%)	(주)효성(80%), (주)한길(10%), (주)태화건설(10%)	
추진상황	- 동화천 교량 포장, 공사용 진입로 개설, 비행기재 1.2터널 굴착	- 교량 3개소 가설, (안양, 용계, 샛터), 용계마을 앞 측구 설치	

## □ 금후계획

- 금년도(5차분) 공사추진 : 2025. 2. ~ 12.
- 전체 공사완료 : 2027. 11.

□ 위치도

**국도 13호 임실-장수 도로시설개량공사(1공구)**





# □ 위치도

## 국도 13호 임실-장수 도로시설개량공사(2공구)

### 평면 및 종 단면도



## 사업개요

- 위 치 : 장수군 장수읍 선창리 ~ 장수군 계남면 호덕리
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사 업 비 : 300억원
- 사업내용 : 도로개설 L=6.06km, B=11.5m, 교량8개소
- 시행기관 : 익산국토관리청

## □ 세부현황

- 노 선 명 : 일반국도19호선(남해~홍천)
- 사 업 비 : 전체 30,046백만원, 금회(4차) 11,270백만원
- 사업기간 : 전체 2022.10.28.~2025.10.11.(1,080일)  
4차분 2025.02.03. ~ 2025.10.11.(251일)
- 시공회사 : 덕재건설(주) 55.0%, 선양건설(주) 25.0%, (주)신진건설산업 20.0%
- 감리회사 : (주)내경엔지니어링(100%)
- 설계회사 : (주)드림이엔지, (주)동아기술공사
- 공 정 율 : 전체 68.1 %

(단위 : 백만원)

구 분	단위	전 체		기 시 행		금 회 (25년)		장 래	
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
총 사 업 비			30,046		17,895		11,270		881
계			28,428		16,839		10,708		881
확 · 포장	km	6.06	19,034	5.57	12,845	0.49	5,473	-	716
교 량	m/개소	132/2		132/2		-		-	
교차로	개소	8		8		0		-	

## □ 금후계획

- 공사 완료 : 2025. 10.



## □ 위치도



## 사업개요

- 위 치 : 장수군 천천면 월곡리 185번지 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 30억원
- 사업내용 : 선형개선 L=1.08km, B=0.9m→10.0m, R=150→300
- 시행기관 : 전북특별자치도(도로관리사업소)


## □ 추진상황

- 실시설계 용역 완료 : 2021. 08.
- 중앙토지수용위원회 사업 인정 : 2023. 09.
- 도로구역 결정(변경) 고시 : 2023. 09.
- 공사발주 : 2024. 09.
- 보상협의 완료 : 2024. 10.

## □ 금후계획

- 사업완료 : 2026. 10.

## □ 위치도 및 전경

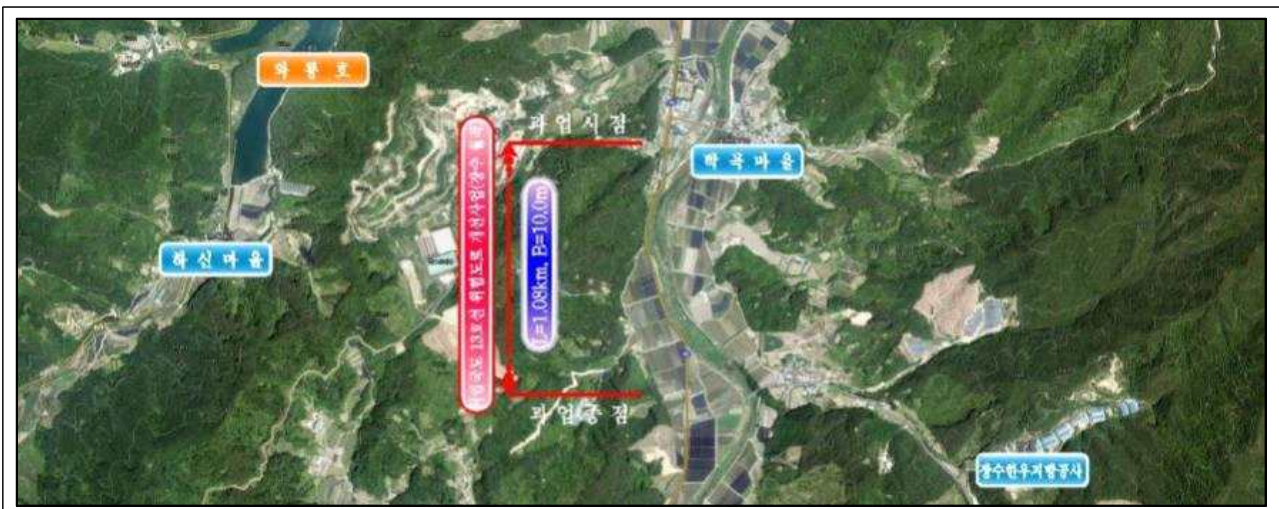



## 사업개요

- 위 치 : 장수군 계남면 화양리 1016번지 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 123억원(군특 113, 군비 10)
- 사업내용 : 도로개설 L=1.37km, B=8.0m, 교량 1개소
- 시행기관 : 장수군

## □ 추진상황

- 전체분 및 1차분 발주 : 2023. 12.
- 1차분 준공 2차분 발주 : 2024. 06.
- 시공사 자금사정으로 인한 공사포기 : 2024. 12.

## □ 금후계획

- 재발주 및 신규 시공사 계약 체결 : 2025. 02.
- 공사 착공 : 2025. 05.
- 공사 준공예정 : 2026. 12.

## □ 위치도



## 사업개요

- 위 치 : 장수군 천천면 춘송리 943-9일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 169억원(특조 1, 도비 10, 군비 158)
- 사업내용 : 도로개설 L=0.8km, B=8.5m
- 시행기관 : 장수군

## □ 추진상황

- 전체분 및 1차분 발주 : 2023. 12.
- 1차분 준공 2차분 발주 : 2024. 05.

## □ 금후계획

## 〈연결공사(춘용선) : 장수군〉

- 2차분 준공 및 3차분 착공 : 2025. 05.
- 공사 완료 : 2026. 12.

## 〈진출입공사 : 한국도로공사〉

- 토지보상 완료 : 2025. 06.
- 공사 완료 : 2025. 03.~ 2026. 12.

## □ 위치도



## 사업개요

- 위 치 : 장수군 장수읍 선창리, 계남면 침곡리 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 사 업 비 : 11.4억원(특조 4, 도비 3.7, 군비 3.7)
- 시행기관 : 장수군

## □ 사업내용

사 업 명	사업내용	사업비 (백만원)	비고
계	2개	1,140	
장수육교 회전교차로 설치사업	회전교차로 설치 2개소	800	
고기교 회전교차로 설치사업	회전교차로 설치 1개소	340	

## □ 추진상황


- 장수육교 회전교차로 실시설계 용역 착수 및 준공 : 2023. 12.~2024. 09.
- 장수육교 회전교차로 설치공사 착공 : 2024. 12.
- 고기교 회전교차로 실시설계 용역 착수 : 2024. 12.

## □ 금후계획

- 고기교 회전교차로 설치공사 착공 및 준공 : 2025. 03.~12.
- 장수육교 회전교차로 설치공사 준공 : 2025. 06.



## □ 위 치 도

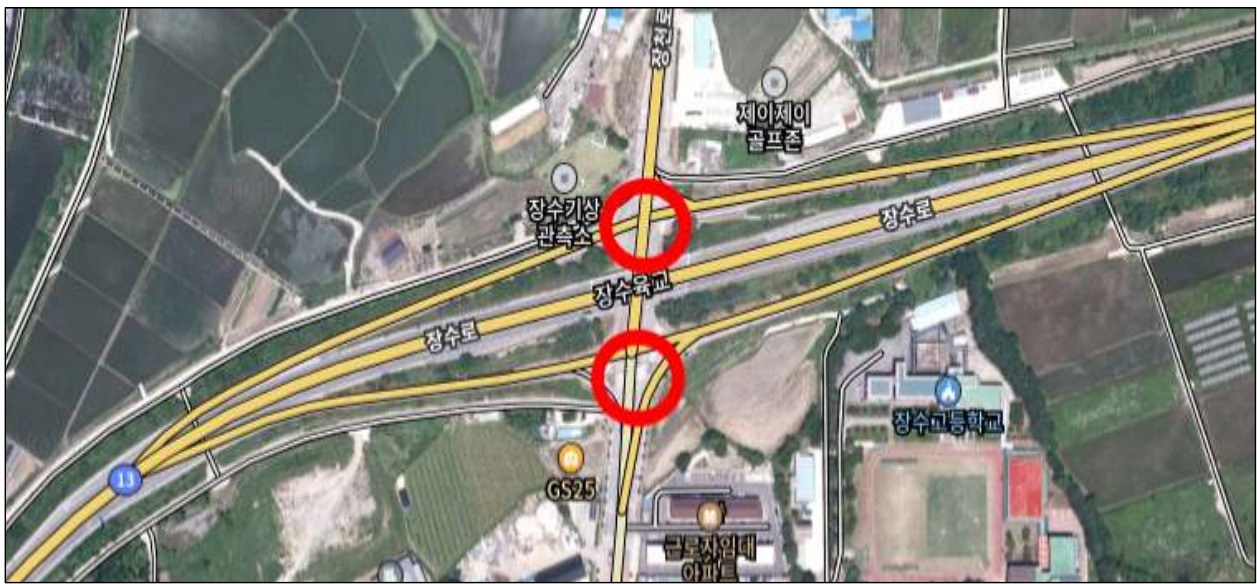

장수육교



고기교

## 사업개요

- 위 치 : 장수군 장수읍 송천리, 장계면 금곡리, 변암면 사암리 일원
- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 27억원(도비 13.5, 군비 13.5)
- 시행기관 : 장수군

## □ 사업내용

사 업 명	사업내용	사업비 (백만원)	비고
계	3개	2,700	
장용선 송천지구	선형개량 L=1.0km, 회전교차로1개소	700	
군도29호 금곡지구	선형개량 L=1.5km	1,000	
군도7호 상임신지구	선형개량 L=1.0km	1,000	

## □ 추진상황


- 장용선 송천지구 위험도로 구조개선공사 착공 : 2024. 10.

## □ 금후계획

- 금곡지구, 상임신지구 실시설계용역 착수 : 2025. 01.
- 장용선 송천지구 위험도로 구조개선공사 준공 : 2025. 12.
- 금곡지구 착공 및 준공 : 2025.06.~2026.12.
- 상임신지구 착공 및 준공 : 2026.01.~2026.12.



## □ 위 치 도

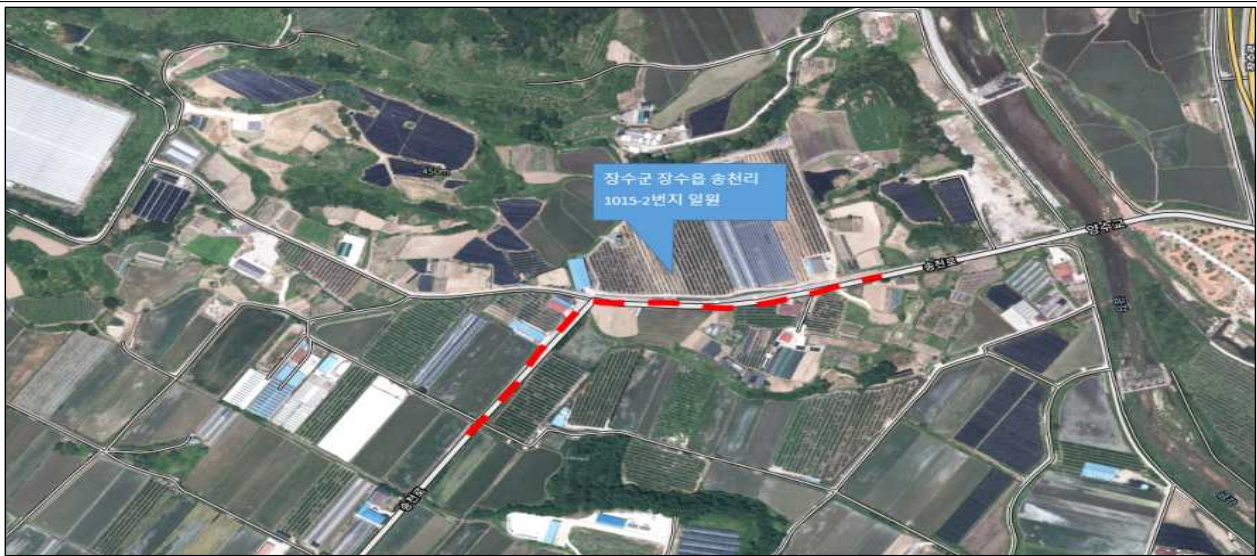

장용선 송천지구



군도29호 금곡지구



군도7호 상임신지구



## 사업개요

- 위 치 : 장수군 번암면 죽림리 173-1번지 일원
- 사업기간 : 2024년 ~ 2025년
- 사 업 비 : 19억원(특교 11 , 군비 8)
- 사업내용 : 교량 재가설 L=40m, B=8.0m
- 시행기관 : 장수군

## □ 추진상황

- 실시설계 용역 착수 : 2023. 11.
- 보상계획 공고 : 2024. 08.
- 분할 측량 : 2024. 09.
- 감정평가 실시 : 2024. 10.
- 실시설계 완료 : 2024. 11.
- 공사착공 : 2024. 12.

## □ 금후계획

- 공사완료 : 2025. 12.

## □ 위치도 및 전경



## 사업개요

- 위 치 : 장수군 천천면 비룡리 288-4번지 일원(지726호)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2028년
- 사 업 비 : 140억원
- 사업내용 : 지방도726호선 도로신설 L=2.5km, B=9.0m(2차로)
- 시행기관 : 전북특별자치도(도로공항철도과)

## □ 추진상황

- 제3차 도로건설관리계획 반영 : 2020.12
- 실시설계용역 착수 : 2022.11
- 주민설명회 실시(천천면 중상마을회관) : 2023.05
- 도로구역 결정(변경) 및 사업인정에 관한 의견청취 공고 : 2024.08
- 도로구역 결정,접도구역 지정 및 지형도면 고시 : 2024.11
- 실시설계용역 준공 : 2024.11
- 토지분할측량(시행중) : 2024.12~

## □ 금후계획

- 토지감정평가(전북개발공사 보상업무 위탁) : 2025.04
- 토지보상협의 공문발송 예정 : 2025.05~
- 사업시행 및 착수(토지협의40%~50%완료시) : 2025.  
(하반기 예정)
- 사업완료 : 2028.12  
(예정)



## □ 위치도



## 사업개요

- 위 치 : 장계면 장계리 일원(남동,동동,서동,신동,중동)
- 사업기간 : 2024년 ~ 2027년
- 사 업 비 : 242억원
- 사업내용 : Red Food 복합 Biz센터 조성, Red Food 어울림관 조성,  
도로정비 및 데크 설치, 노후주택 및 골목길정비, 공영  
주차장 조성
- 시행기관 : 장수군

## □ 추진상황

- 장계면 도시재생활성화계획(안) 주민공청회 실시 : 2023. 8.
- 2023년 도시재생 사업 공모 결과 최종 선정 : 2023. 12.
- 장계면 도시재생 활성화계획 승인 및 고시 : 2024. 6.
- 공공건축 사전검토 완료(Red Food 복합 Biz 센터, 어울림관) : 2024. 10.
- Red Food 만나러 가는 길(인도데크) 실시설계 시행 : 2024. 11.

## □ 금후계획

- Red Food 복합 Biz센터 조성을 위한 주민의견수렴 : 2025. 1.
- Red Food 복합 Biz센터 설계공모 추진 : 2025. 2.
- Red Food 만나러 가는 길(인도데크) 실시설계 완료 : 2025. 3.
- 데크설치 정비공사 착공 : 2025. 4.
- Red Food 복합 Biz센터 실시설계 용역 착수 : 2025. 5.



## □ 위치도





## 사업개요

- 위 치 : 계남면 가곡리 산 45번지 일원
- 사업기간 : 2025년 ~ 2027년
- 사 업 비 : 190억원
- 사업내용 : 봉안당, 자연장지, 부대시설 등 49,500㎡ 개발
  - 장사시설(13,500㎡) : 봉안당(1,500㎡), 자연장지(12,000㎡)
  - 부대시설(36,000㎡) : 주차장, 관리사무실 유족 편의 시설 휴게공간 등
- 시행기관 : 장수군



## □ 추진상황

- 공설장사시설 조성사업 부지 선정(계남면 가곡리) : 2023. 12
- 지방재정 투자심사 완료 : 2024. 7.
- 매장유산 지표조사 완료 : 2024. 11.

## □ 금후계획

- 공설장사시설 조성사업 부지 매입 : 2025. 1. ~
- 공설장사시설 조성사업 기본 및 실시설계 시행 : 2025. 1. ~ 8.
- 장수군 공설장사시설 조성사업 시행 : 2025. 9. ~

## □ 위치도

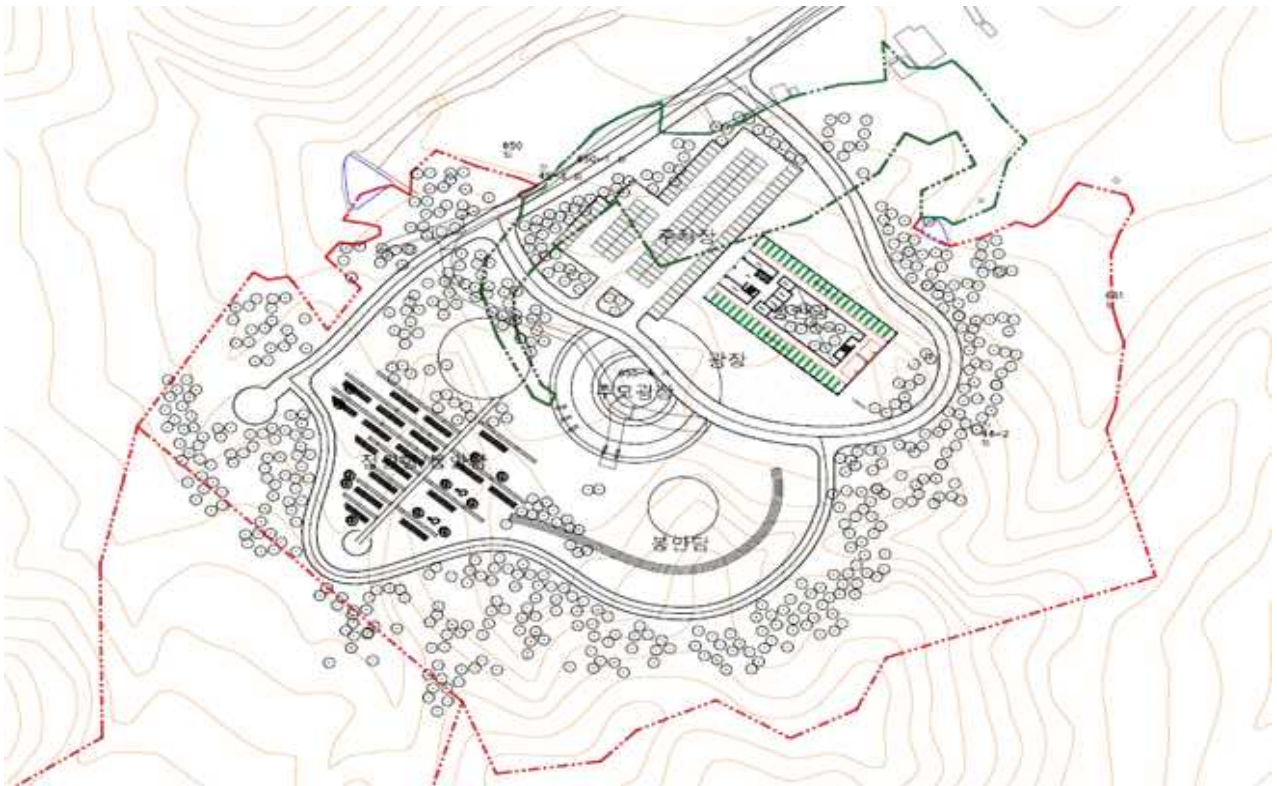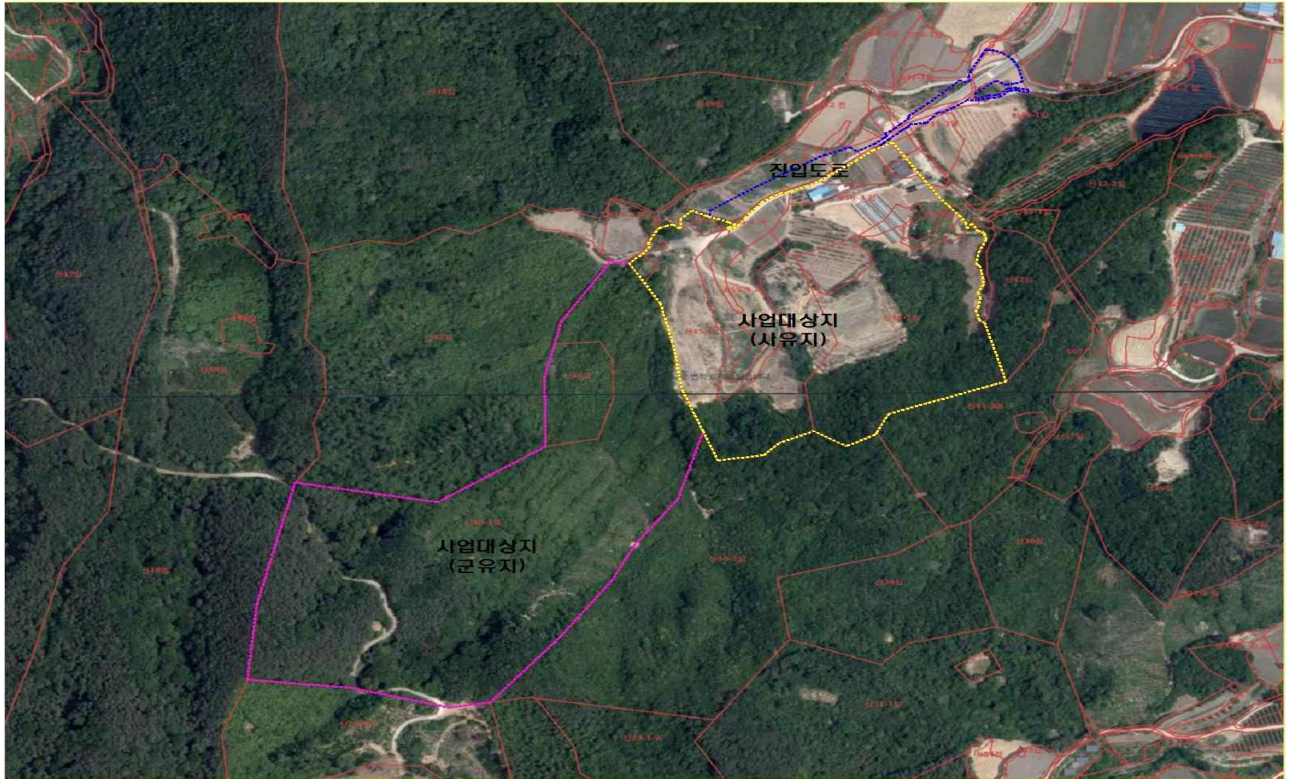


## 사업개요

- 위 치 : 장수읍 장수리 419-1일원
- 사업기간 : 2025년
- 사 업 비 : 15억원
- 사 업 량 : 926㎡
- 시행기관 : 장수군청
- 사업내용 : 장수중학교 등하교 차량 통행에 따른 학생 안전문제 발생 및 협소한 도로로 인한 주차장 조성 필요

## □ 위 치 도

위 성 도

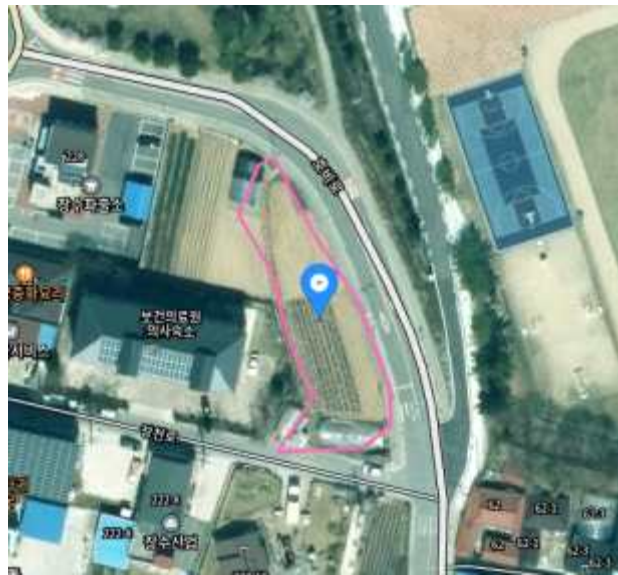

현 장 사 진



## □ 금 후 계 획

- 실시설계 용역 발주 : 2025. 1.
- 설계도서 확인 및 공사 시행 : 2025. 3.
- 공사완료 : 2025. 12.



## 사업개요

- 위 치 : 장수군 천천면 월곡리, 장관리 일원
- 사업기간 : 2024년 ~ 2025년
- 사 업 비 : 800백만원(도비 640, 군비 160)
- 사 업 량 : 배수로 L = 1,406m
- 사업내용 : 배수체계 개선 및 배수로 정비 등 현대화
- 수혜면적 : 14ha

## □ 추진상황

- 소규모 배수개선사업 대상지 및 예산 확정 : 2023. 11.
- 기본 및 실시설계 추진 : 2024. 02. ~ 12.
- 사업 시행계획 수립 승인 : 2024. 12.

## □ 금후계획

- 공사착수 : 2025. 02.
- 공사완료 : 2025. 12.

## □ 위치도

